

I)


HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	týden1	týden2	týden3	týden4	týden5	týden6	týden7	týden8	týden9	týden10	týden11	týden12	týden13	týden14	týden15	týden16	týden17	týden18	týden19	týden20	týden21	týden22
1	UK - FHS - Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu	539 dny																						
2	Podpis smlouvy o dílo	1 den																						
3	předání a převzetí staveniště	1 den																						
4	Demolice, bourací a demontážní práce	250 dny																						
5	Budova původní menzy (budova C) - odstrojení a demolice nenosných konstrukcí stávajícího objektu	0 dny																						
6	nové konstrukce a práce	350 dny																						
7	Budova původní menzy (budova C) - realizace nosných konstrukcí - souběžné práce na bourání, zesílení a podchycení stávajících nosných konstrukcí, realizace nových nosných konstrukcí	0 dny																						
8	Budova původní menzy (budova C) - realizace zastřešení, fasády objektu, včetně střešního světlíku, tj. uzavření vnější obálky objektu	0 dny																						
9	profese	295 dny																						
10	komunikace a venkovní úpravy	220 dny																						
11	Střešní plato - odstranění stávajících střešních vrstev, konstrukční úpravy, nové zastřešení plato	0 dny																						
12	dokončovací konstrukce a práce	240 dny																						
13	Budova původní menzy (budova C) - PSV - realizace zděných příček, hrubých podlah, SDK příček	0 dny																						
14	Zahájení zkušebního provozu	0 dny																						
15	Zkušební provoz	60 dny																						
16	převzetí díla	0 dny																						



Projekt: hmg Datum: 30.6. 16	Úkol		Souhrnný		Zahrnutý průběh		Souhrn projektu	
	Průběh		Zahrnutý úkol		Rozdělení		Seskupit podle souhrnu	
	Milník		Zahrnutý milník		Vnější úkoly		Konečný termín	

52	týden53	týden54	týden55	týden56	týden57	týden58	týden59	týden60	týden61	týden62	týden63	týden64	týden65	týden66	týden67	týden68	týden69	týden70	týden71	týden72	týden73	týden74	týden75	týden76	týden77
----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

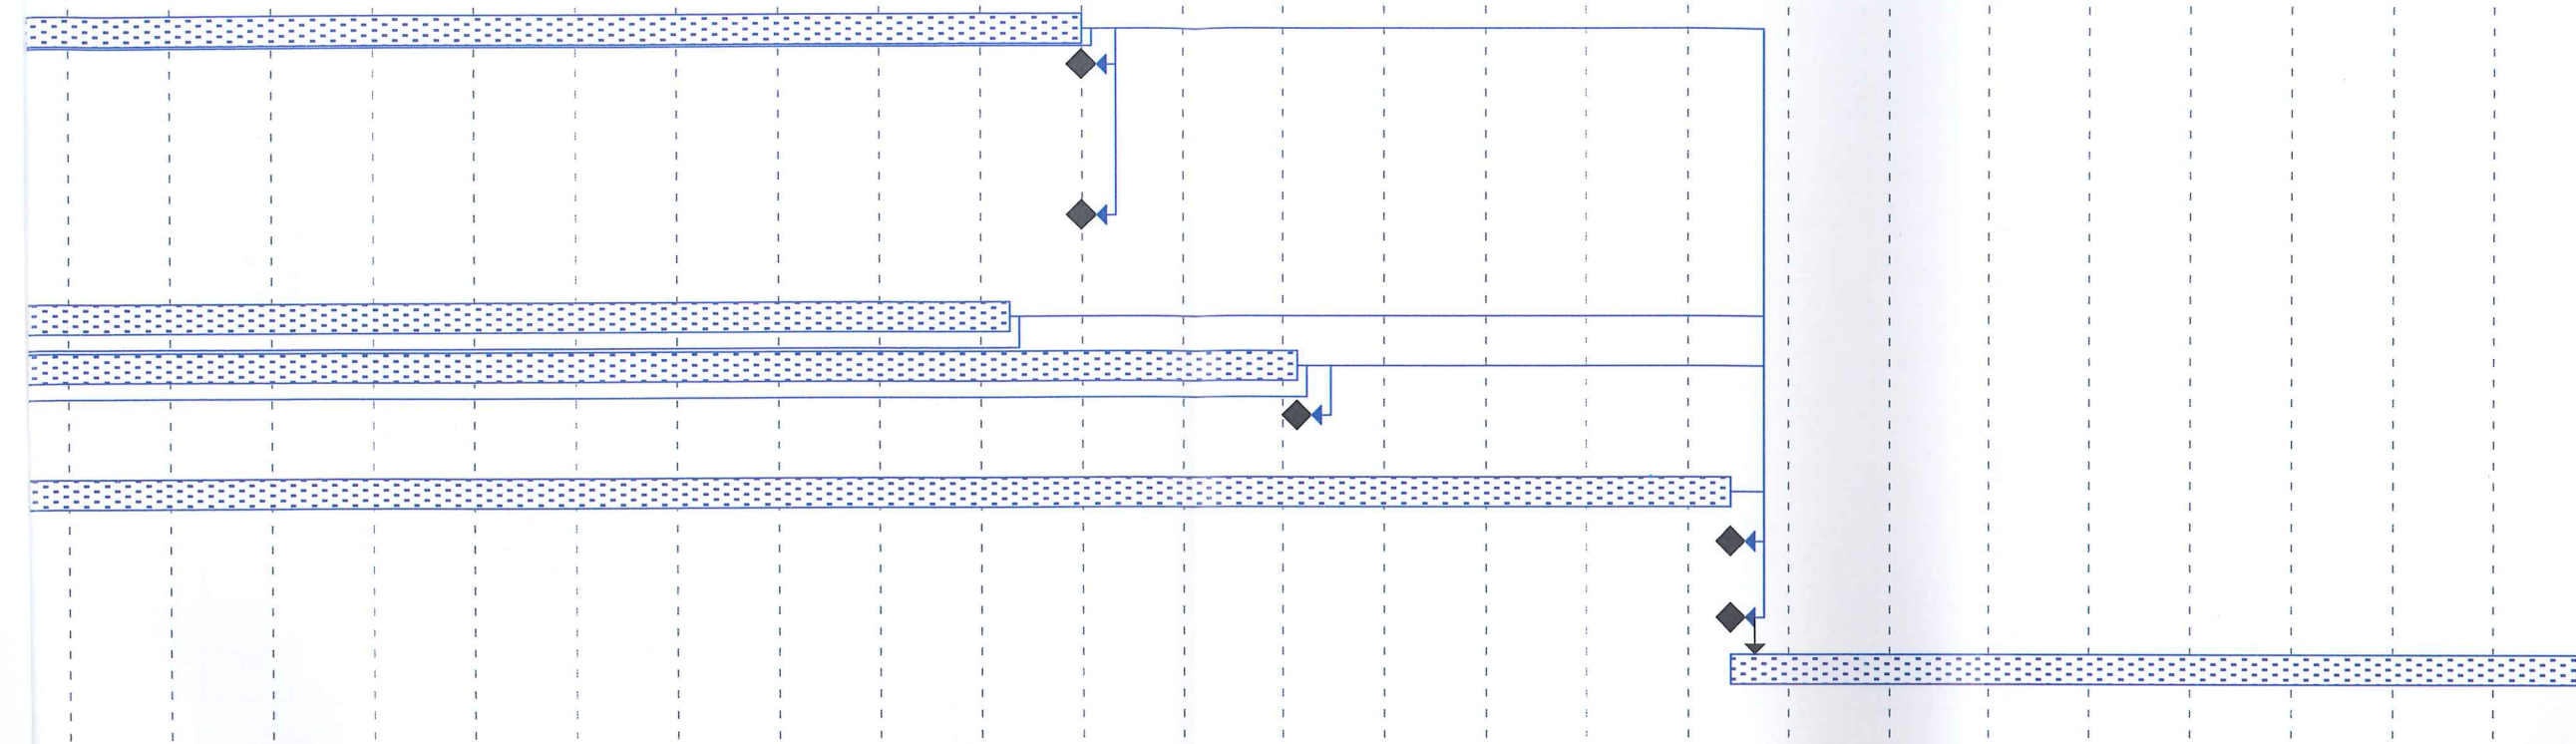

Úkol		Souhrnný		Zahrnutý průběh		Souhrn projektu	
Průběh		Zahrnutý úkol		Rozdělení		Seskupit podle souhrnu	
Mílník		Zahrnutý mílník		Vnější úkoly		Konečný termín	

UK - FHS - Rekonstrukce objektu menzy 17.listopadu

PLATEBNÍ PLÁN

Předmět plnění	Předpokládané měsíční plnění (fakturace) 2016												Cena díla celkem
	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	
Demolice, bourací a demontážní práce									1 473 000 Kč	3 044 200 Kč	2 946 000 Kč	3 044 200 Kč	10 507 398 Kč
Nové konstrukce a práce												13 004 921 Kč	13 004 921 Kč
Profese													0 Kč
Komunikace a venkovní úpravy													0 Kč
Dokončovací konstrukce a práce													0 Kč
Zkušební provoz													0 Kč
Součet	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 473 000 Kč	3 044 200 Kč	2 946 000 Kč	16 049 121 Kč	23 512 319 Kč

Předmět plnění	Předpokládané měsíční plnění (fakturace) 2017												Cena díla celkem
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	
Demolice, bourací a demontážní práce	3 044 200 Kč	2 749 600 Kč	3 044 200 Kč	2 946 000 Kč	2 258 600 Kč								14 042 598 Kč
Nové konstrukce a práce	14 931 576 Kč	13 486 585 Kč	14 931 576 Kč	14 449 912 Kč	14 931 576 Kč	14 449 912 Kč	14 931 576 Kč	14 931 576 Kč	14 449 912 Kč	14 931 576 Kč	9 151 611 Kč		155 577 389 Kč
Profese	2 591 671 Kč	9 070 849 Kč	10 042 726 Kč	9 718 767 Kč	10 042 726 Kč	9 718 767 Kč	10 042 726 Kč	10 042 726 Kč	9 718 767 Kč	10 042 726 Kč	6 155 219 Kč		97 187 673 Kč
Komunikace a venkovní úpravy					255 924 Kč	274 204 Kč	283 344 Kč	283 344 Kč	274 204 Kč	283 344 Kč	274 204 Kč	82 261 Kč	2 010 831 Kč
Dokončovací konstrukce a práce					8 429 116 Kč	14 048 526 Kč	14 516 810 Kč	14 516 810 Kč	14 048 526 Kč	14 516 810 Kč	14 048 526 Kč	14 516 810 Kč	108 641 934 Kč
Zkušební provoz													0 Kč
Součet	20 567 447 Kč	25 307 034 Kč	28 018 502 Kč	27 114 679 Kč	35 917 941 Kč	38 491 410 Kč	39 774 457 Kč	39 774 457 Kč	38 491 410 Kč	39 774 457 Kč	29 629 561 Kč	14 599 071 Kč	377 460 425 Kč

Předmět plnění	Předpokládané měsíční plnění (fakturace) 2018												Cena díla celkem
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	
Demolice, bourací a demontážní práce													0 Kč
Nové konstrukce a práce													0 Kč
Profese													0 Kč
Komunikace a venkovní úpravy													0 Kč
Dokončovací konstrukce a práce	3 746 274 Kč												3 746 274 Kč
Zkušební provoz	3 581 777 Kč	4 360 424 Kč	1 401 565 Kč										9 343 765 Kč
Součet	7 328 050 Kč	4 360 424 Kč	1 401 565 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	13 090 039 Kč

Uvedené ceny v Kč včetně DPH - 21%

Datum: 1.7.2016

Za zhotovitele:

